

校园节能试点：示例数据与实施方案

本文全部数据为演示系统验证用示例，非真实观测或已实现效果。
面向学校管理团队组织约 10 页中文汇报，保留数据性质和单位。
不要把目标写成结果。

核心建议：先基线，再小范围验证

先建立清楚用电基线，再小范围改造与测量。

确认安全和使用体验后再考虑扩大。

节能需设备、使用方式和管理流程共同配合。

单看月度总量不能证明改造产生因果效果。

试点范围与安全边界

覆盖教学楼 A、教学楼 B、图书馆和体育馆。

比较区间统一为一个示例月份。

首批工作为教学楼照明与公共区域控制。

实验室、消防和应急照明不进入自动断电范围。

范围扩大前必须重新检查安全要求。

示例基线与目标：仅说明数据组织方法

表格基线和目标仅用于说明数据组织方法。

单位统一为千瓦时。

目标是计划值，尚未实现。

不能作为改造后的实际测量。

各区域示例月基线与试点月目标

数据为演示用示例，目标为计划值，尚未实现。


单位统一为千瓦时。

区域	示例月基线	试点月目标
教学楼 A	12000	10000
教学楼 B	9000	8000
图书馆	8000	7000
体育馆	6000	5500

示例基线与目标对比图

纵轴单位为千瓦时，系列区分基线和目标。

数据为演示用示例，目标为计划值，尚未实现。

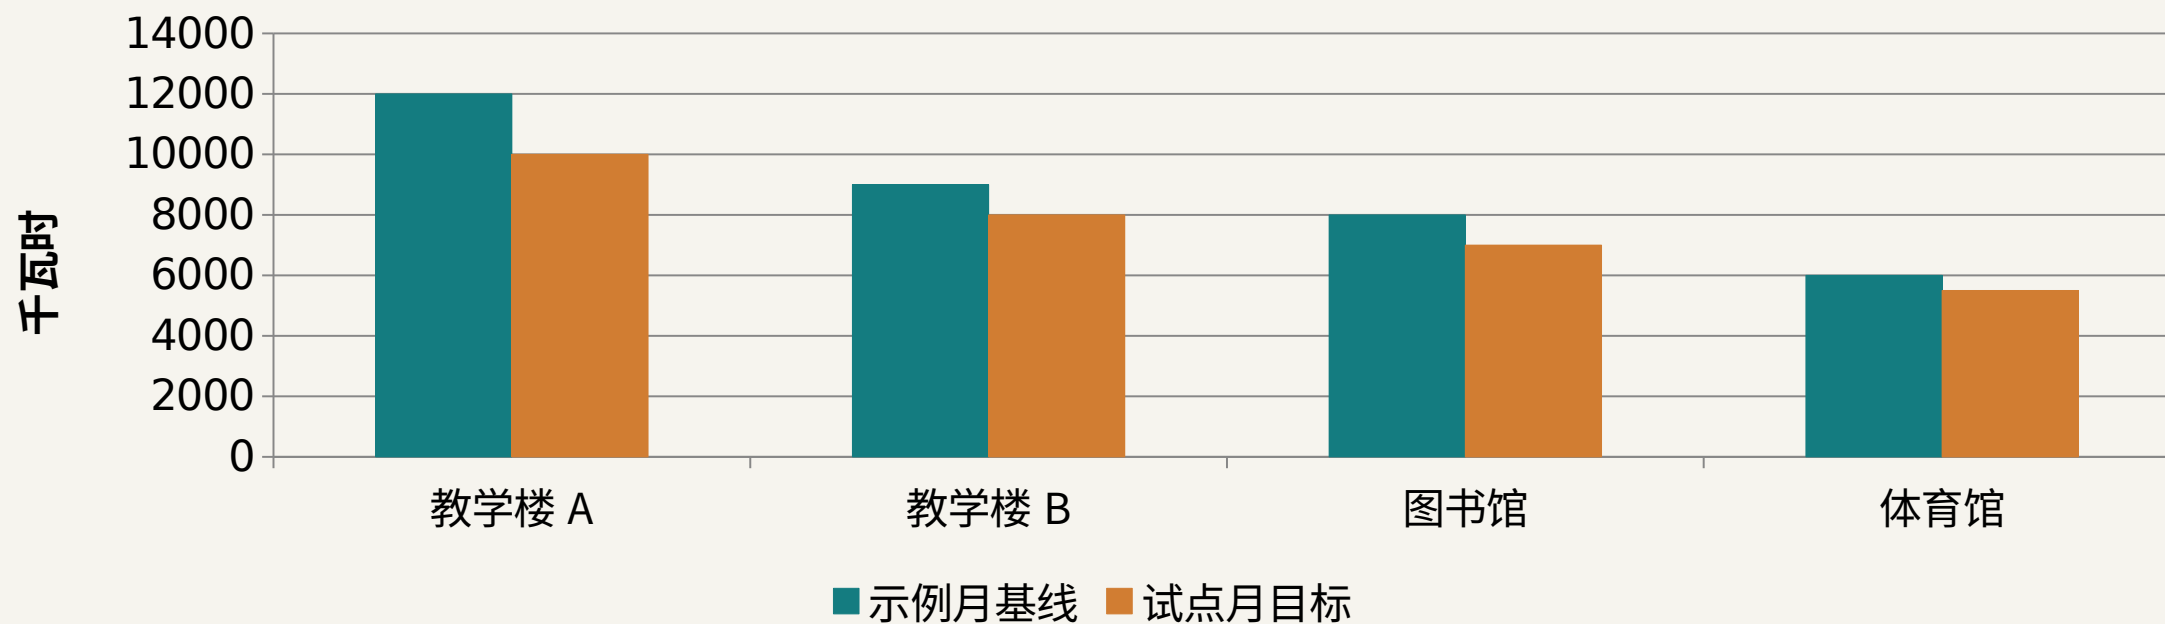

数据解读：不能只凭两个数值认定节能率

总用电受开放时间、人员规模、天气和活动安排影响。

不能只凭两个数值认定节能率或项目收益。

本文没有提供真实节能率和投资回收期。

改造措施：照明、管理与设备选择

照明措施：检查空置时段、分区控制、自然采光配合、维护故障灯具。

管理措施：巡查记录、异常反馈和负责人确认。

自动控制应允许人工覆盖，并保留应急照明。

设备更换需结合现有设施实际情况选择，不能从示例数据推定品牌或采购价格。

实施安排：准备、试点、观察、复盘

准备阶段：完成设施清单、基线记录和安全检查。

试点阶段：按区域逐步实施，保留原设置以便恢复。

观察阶段：对比相同口径数据，记录开放时长与活动变化。

复盘阶段：检查能耗、照明体验、安全反馈和维护负担，再决定继续、调整或停止。

责任分工、风险限制与下一步

建议分工：后勤负责设施清单、维护与安全检查；使用部门确认开放时间、特殊活动和现场体验；数据负责人统一统计口径并保留原始记录；项目协调人组织复盘。

风险：设备改造可能影响照明体验；过度自动化可能造成误关；统计口径变化可能制造虚假改善。

缺少真实对照与现场测量时，结论应保持待验证，不对外宣称节能效果已实现。

下一步：确认现场范围与负责人，补齐真实基线，执行可恢复的试点。
